

COMUNE DI MASONE

Provincia di Genova

PROGETTO

**“LAVORI DI CONSOLIDAMENTO IN SOMMITÀ DEL MOVIMENTO
FRANOSO DEL CIGLIO STRADALE CON MICROPALI E CORDOLO IN.
C.A. STRADA COMUNALE IN VALLE STURA IN LOC.ROCCA”
CUP E17H22000190001**

(CAT. OG3)

(importo Progetto € 65.000,00 – Opere € 43.009,55)

Progetto Esecutivo

CRONOPROGRAMMA



Il Progettista

Sez. A
Architetto
GIORGIO
OLIVIERI
N° 711
Giorgio Olivieri

Il Responsabile



[Handwritten signature]

Masone, 05/09/2023

Comune di MASONE

Provincia di Genova

OGGETTO:

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Masone

IMPRESA: Appaltatrice

RELAZIONE

PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

Il PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI allegato alla presente relazione, prescritto dal capitolato speciale d'appalto, è stato redatto in ottemperanza al comma 10 dell'articolo 43 del D.P.R. 207/2010.

Tempi di esecuzione

Dai calcoli effettuati, tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole, è risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari **60** giorni naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nella definizione della durata e della produttività delle attività si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonché della chiusura dei cantieri per festività.

Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni: Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

Tabella Climatico Ambientale:


condizione	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	media
Favorevole	90	90	90	90	90	90	90	45	90	90	90	45	82.5
Normale	15	15	75	90	90	90	90	45	90	90	75	15	65
Sfavorevole	15	15	45	90	90	90	90	45	90	75	45	15	58.75

La disposizione delle attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione condiziona la reale produttività che l'impresa si vincola a tenere durante la realizzazione, per rispettare i tempi indicati.

Produzione mensile

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal programma allegato verrà garantita, attraverso le risorse impegnate e l'organizzazione dei lavori, una produzione mensile media tale da poter realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di euro 21'803,45 ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro 27'717,99 .

Masone, 05/09/2023

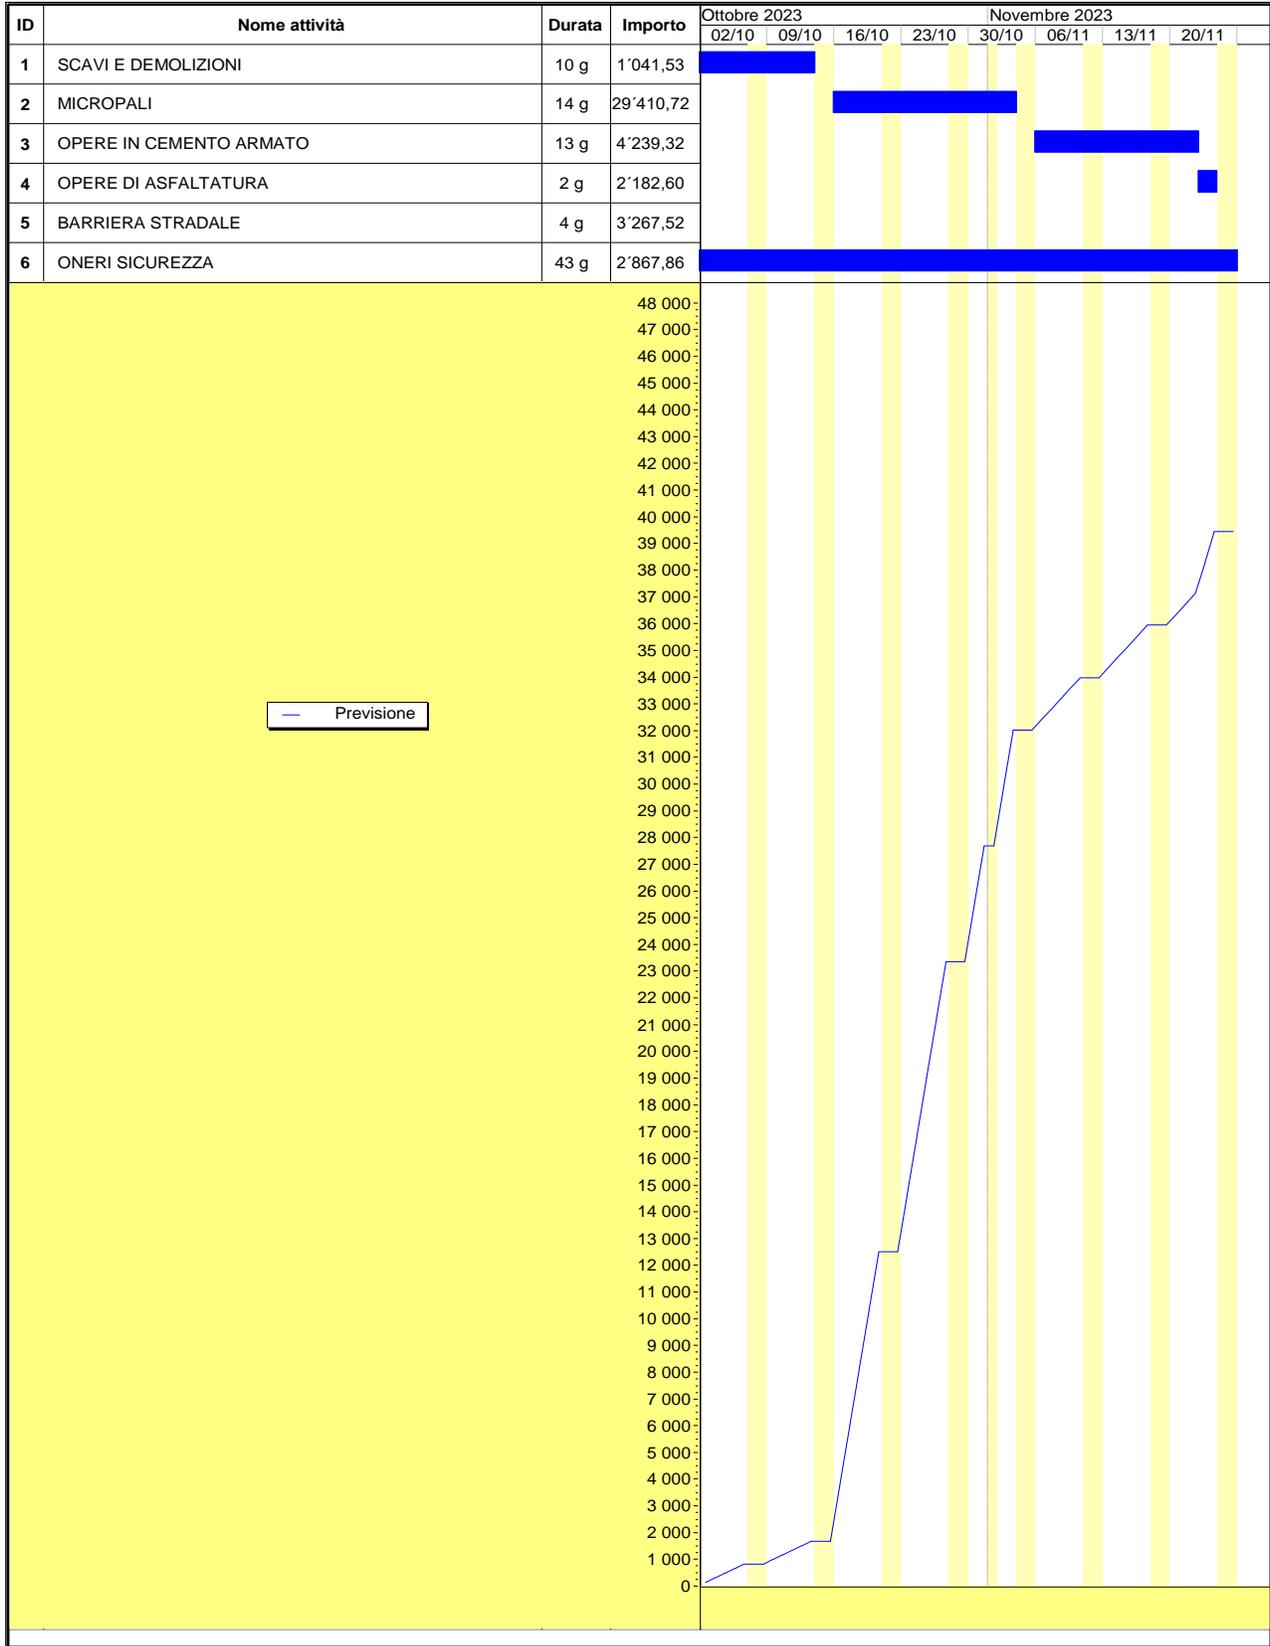

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
SCAVI E DEMOLIZIONI	1'041,53	2,422	02/10/2023	13/10/2023	10	12
MICROPALI	29'410,72	68,382	16/10/2023	03/11/2023	14	19
OPERE IN CEMENTO ARMATO	4'239,32	9,857	06/11/2023	22/11/2023	13	17
OPERE DI ASFALTATURA	2'182,60	5,075	23/11/2023	24/11/2023	2	2
BARRIERA STRADALE	3'267,52	7,597	27/11/2023	30/11/2023	4	4
ONERI SICUREZZA	2'867,86	6,668	02/10/2023	30/11/2023	43	60
Masone, 05/09/2023						
Tecnico Arch Giorgio Olivieri						

