



PLANIMETRIA CANTIERE - ZONA VIA SCAGLIA



DETTAGLIO APPRESTAMENTI PER ACCESSO ALLE ABITAZIONI

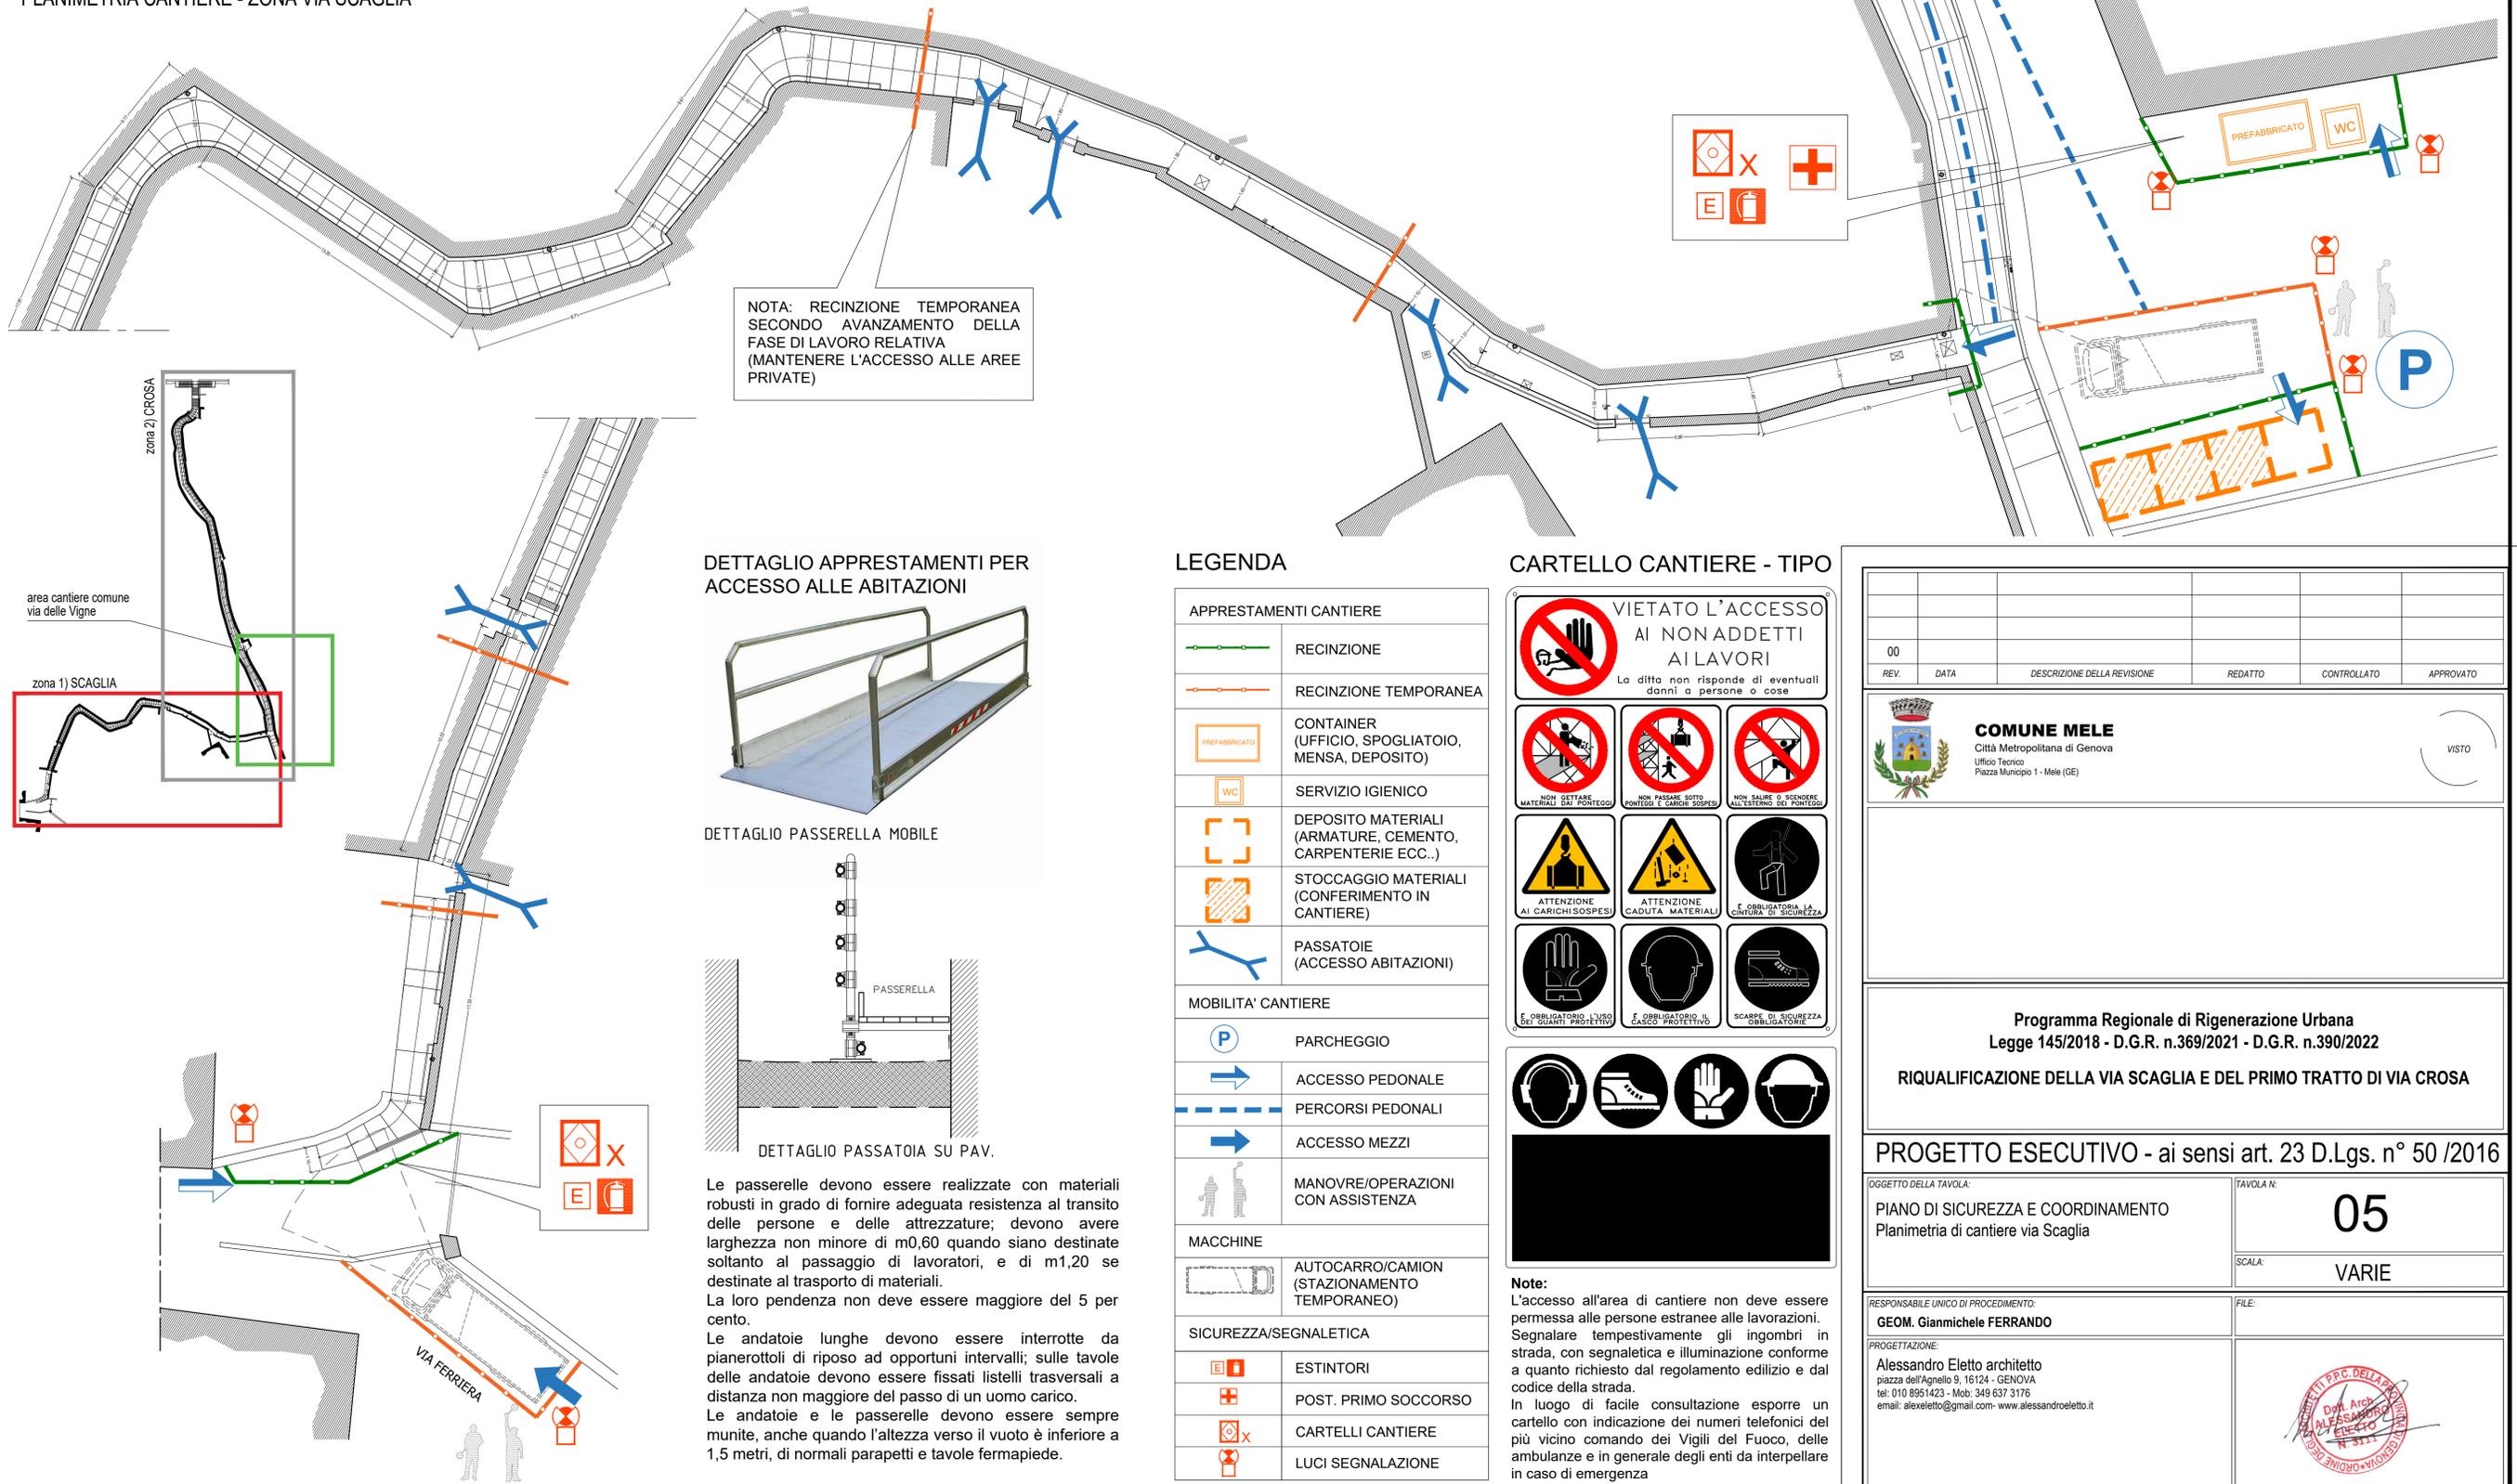

DETTAGLIO PASSERELLA MOBILE

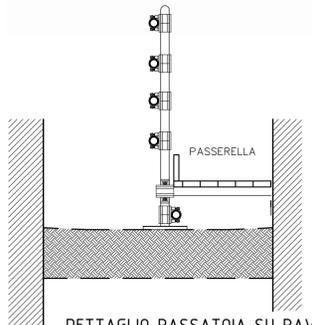

DETTAGLIO PASSATOIA SU PAV.

Le passerelle devono essere realizzate con materiali robusti in grado di fornire adeguata resistenza al transito delle persone e delle attrezzature; devono avere larghezza non minore di m0,60 quando siano destinate soltanto al passaggio di lavoratori, e di m1,20 se destinate al trasporto di materiali. La loro pendenza non deve essere maggiore del 5 per cento. Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico. Le andatoie e le passerelle devono essere sempre munite, anche quando l'altezza verso il vuoto è inferiore a 1,5 metri, di normali parapetti e tavole fermapiede.

LEGGENDA

APPRESTAMENTI CANTIERE	
	RECINZIONE
	RECINZIONE TEMPORANEA
	CONTAINER (UFFICIO, SPOGLIATOIO, MENSA, DEPOSITO)
	SERVIZIO IGIENICO
	DEPOSITO MATERIALI (ARMATURE, CEMENTO, CARPENTERIE ECC..)
	STOCCAGGIO MATERIALI (CONFERIMENTO IN CANTIERE)
	PASSATOIE (ACCESSO ABITAZIONI)
MOBILITA' CANTIERE	
	PARCHEGGIO
	ACCESSO PEDONALE
	PERCORSI PEDONALI
	ACCESSO MEZZI
	MANOVRE/OPERAZIONI CON ASSISTENZA
MACCHINE	
	AUTOCARRO/CAMION (STAZIONAMENTO TEMPORANEO)
SICUREZZA/SEGNALETICA	
	ESTINTORI
	POST. PRIMO SOCCORSO
	CARTELLI CANTIERE
	LUCI SEGNALEAZIONE

CARTELLO CANTIERE - TIPO

**VIETATO L'ACCESSO AI NON ADDETTI AI LAVORI**  
La ditta non risponde di eventuali danni a persone o cose

NON GETTARE MATERIALI DA PONTEGGI  
NON PASSARE SOTTO PONTEGGI E CARICHI SOSPESI  
NON SALIRE O SCENDERE ALL'ESTERNO DEI PONTEGGI

ATTENZIONE AI CARICHI SOSPESI  
ATTENZIONE CADUTA MATERIALI  
E' OBBLIGATORIA LA CINTURA DI SICUREZZA

E' OBBLIGATORIO L'USO DEI GUANTI PROTETTIVI  
E' OBBLIGATORIO IL CASCO PROTETTIVO  
SCARPE DI SICUREZZA OBBLIGATORIE

Icone: Casco, Scarpe, Guanti, Cintura di sicurezza

**Note:**  
L'accesso all'area di cantiere non deve essere permessa alle persone estranee alle lavorazioni. Segnalare tempestivamente gli ingombri in strada, con segnaletica e illuminazione conforme a quanto richiesto dal regolamento edilizio e dal codice della strada. In luogo di facile consultazione esporre un cartello con indicazione dei numeri telefonici del più vicino comando dei Vigili del Fuoco, delle ambulanze e in generale degli enti da interpellare in caso di emergenza

00	REV.	DATA	DESCRIZIONE DELLA REVISIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
<p><b>COMUNE MELE</b> Città Metropolitana di Genova Ufficio Tecnico Piazza Municipio 1 - Mele (GE)</p> <p>VISTO</p>						
<p align="center"><b>Programma Regionale di Rigenerazione Urbana</b> Legge 145/2018 - D.G.R. n.369/2021 - D.G.R. n.390/2022</p> <p align="center"><b>RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA SCAGLIA E DEL PRIMO TRATTO DI VIA CROSA</b></p>						
<p align="center"><b>PROGETTO ESECUTIVO - ai sensi art. 23 D.Lgs. n° 50 /2016</b></p>						
OGGETTO DELLA TAVOLA:			TAVOLA N:			
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO Planimetria di cantiere via Scaglia			05			
SCALA:			VARIE			
RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO:			FILE:			
GEOM. Gianmichele FERRANDO						
PROGETTAZIONE:			<p>Alessandro Eletto architetto piazza dell'Agnetto 9, 16124 - GENOVA tel: 010 8951423 - Mob: 349 637 3176 email: alexeletto@gmail.com - www.alessandroeletto.it</p>			
